

# 甘肃省 2021 年度农村水源 保障工程建设进展情况

## 旬 报

(8 月中旬)

甘肃省水利厅

2021 年 8 月 20 日

全省 2021 年度农村水源保障工程建设任务进展情况如下：

省政府为民实事 100 处农村水源保障工程涉及 10 个市州，54 个县区，估算总投资 6.8 亿元。

### 一、资金到位情况

已到位资金 6.58 亿元，资金到位率 97%。其中：平凉市、武威市、兰州市、白银市、天水市、甘南州均为 100%，定西市 99%、**庆阳市 87%、临夏州 81%、陇南市 78%**。有 50 个县区资金已全部到位。

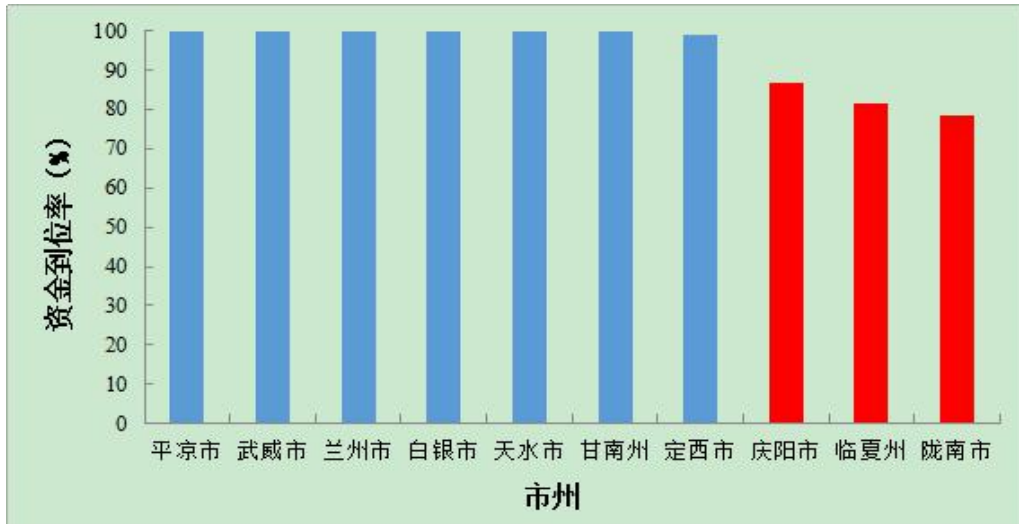


图 1 市（州）资金到位情况

## 二、投资完成情况

已完成投资 6.41 亿元，投资完成率 94%。其中：兰州市 100%、白银市 100%、定西市 95%、平凉市 92%、天水市 91%、庆阳市 90%、**甘南州 85%、临夏州 85%、陇南市 84%、武威市 81%**。有 57 处工程已完成建设任务。

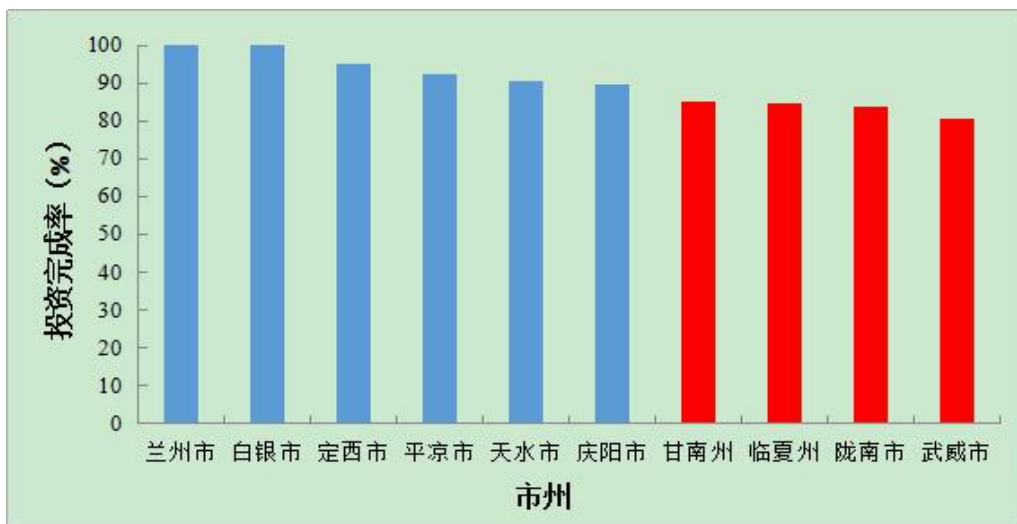


图 2 市（州）投资完成情况

---

送：厅领导，省纪委监委派驻省水利厅纪检监察组，厅总工程师、  
总规划师，厅机关各处室，厅属有关单位，厅 2021 年为民办  
实项目联系包抓督导组。

发：有关市（州）、县（区、市）水务局。

---
