

# 甘肃省 2021 年度农村水源 保障工程建设进展情况

## 月 报

(8 月)

甘肃省水利厅

2021 年 8 月 31 日

---

全省 2021 年度农村水源保障工程建设任务进展情况如下：

省政府为民实事 100 处农村水源保障工程涉及 10 个市州，54 个县区，估算总投资 6.8 亿元。

### 一、资金到位情况

已到位资金 6.59 亿元，资金到位率 97%。其中：平凉市、武威市、兰州市、白银市、定西市、天水市、甘南州均为 100%，**庆阳市 87%、临夏州 81%、陇南市 78%**。有 51 个县区资金已全部到位。

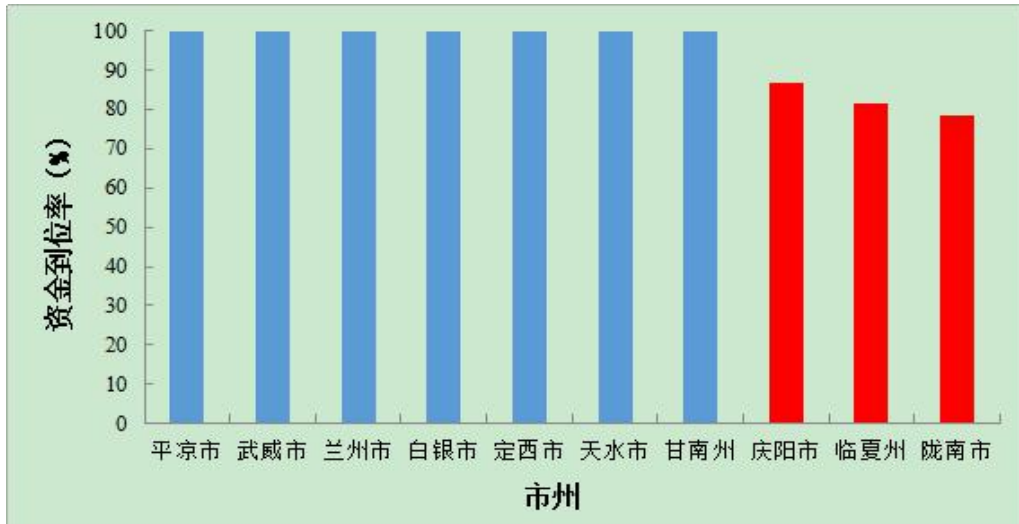


图1 市（州）资金到位情况

## 二、投资完成情况

已完成投资 6.46 亿元，投资完成率 95%。其中：兰州市 100%、白银市 100%、平凉市 96%、定西市 96%、庆阳市 95%、天水市 93%、甘南州 91%、临夏州 90%、**陇南市 86%、武威市 84%**。有 57 处工程已完成建设任务。

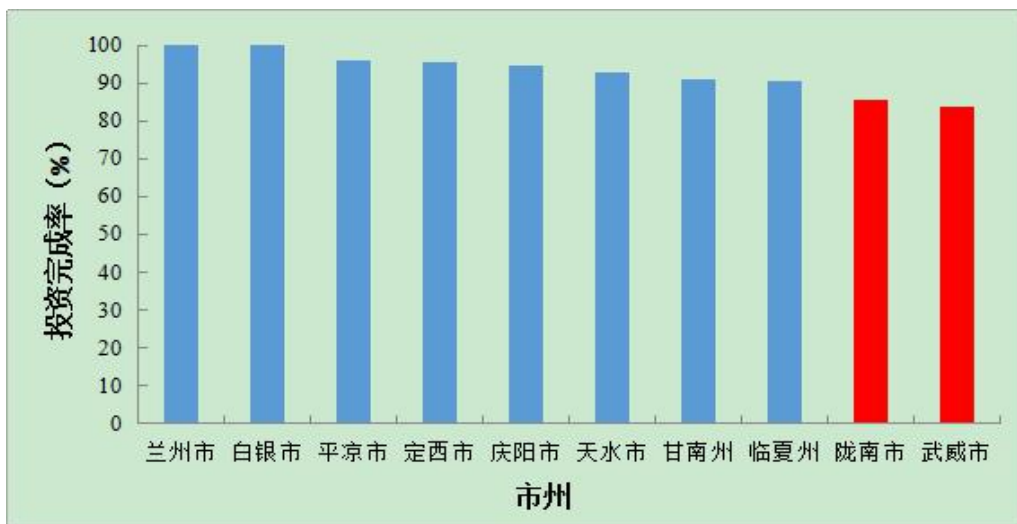


图2 市（州）投资完成情况

---

呈：孙雪涛副省长

送：厅领导，省纪委监委派驻省水利厅纪检监察组，厅总工程师、总规划师，厅机关各处室，厅属有关单位，厅 2021 年为民办实事项目联系包抓督导组。

抄：有关市（州）、县（区、市）人民政府。

发：有关市（州）、县（区、市）水务局。

---
