

甘肃省 2021 年度农村水源 保障工程建设进展情况

旬 报

(10 月上旬)

甘肃省水利厅

2021 年 10 月 10 日

全省 2021 年度农村水源保障工程建设任务进展情况如下：

省政府为民实事 100 处农村水源保障工程涉及 10 个市州，54 个县区，估算总投资 6.8 亿元。


一、资金到位情况

已到位资金 7.05 亿元，其中：平凉市、武威市、兰州市、白银市、定西市、庆阳市、天水市、甘南州等 8 个市州资金足额到位，**陇南市康县、临夏州临夏县**资金未足额到位。

二、投资完成情况

已完成投资 7.1 亿元。其中：兰州市、白银市、定西市、临夏州等 4 个市州已完成建设任务；6 个市州暂未完成建设任务，投资完成率分别为庆阳市 99%、平凉

市 99%、天水市 99%、甘南州 98%、武威市 97%、**陇南市 92%**。有 85 处工程已完成建设任务。

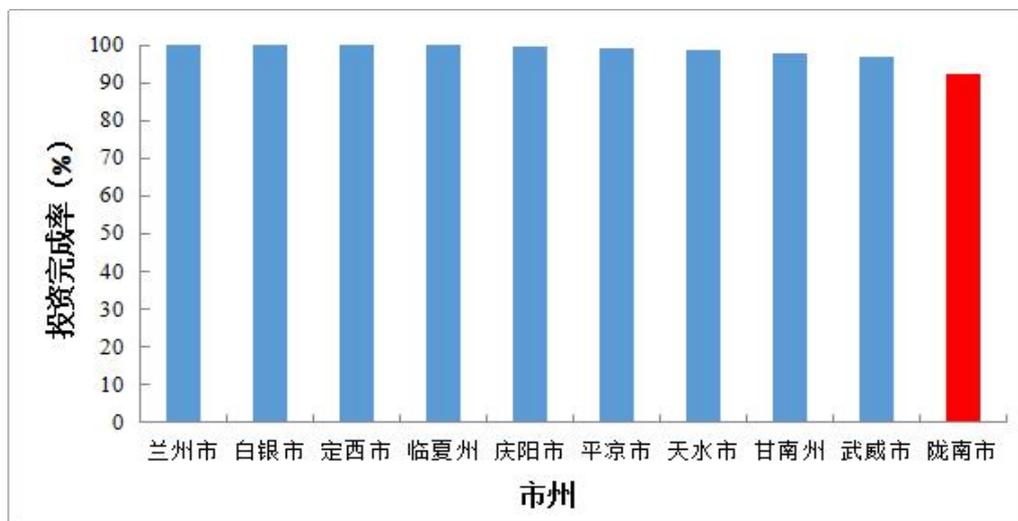

市（州）投资完成情况

送：厅领导，省纪委监委派驻省水利厅纪检监察组，厅总工程师、总规划师，厅机关各处室，厅属有关单位，厅 2021 年为民办实事项目联系包抓督导组。

发：有关市（州）、县（区、市）水务局。
